

KL

FÆLLES FAGLIGE BEGREBER – BØRN & UNGE

Afrapportering

Digitaliseringsprogrammet 2021-2025

Delprogram 5: Bedre velfærd og styring med data

Indholdsfortegnelse

Hvad var formålet i projektet?	3
Hvad er det samlede økonomiske forbrug?	3
Hvordan var processen og inddragelsen af kommuner?	4
Hvad er status på projektets leverancer og succeskriterier?	4
Hvad sker der efter projektets afslutning?	9
Formidling af projektet	12

Hvad var formålet i projektet?

Uddrag fra formålsbeskrivelsen i den oprindelige projektbeskrivelse:

”Projekt mere viden om indsatser og resultater skal være med til at kvalificere den faglige del af de resultatmålinger, som i dag kan foretages i kommunernes it-fagsystemer. Samtidig er der behov for at sikre at alle kommuner anvender et fælles sprog om de indsatser, der iværksættes og resultatmålinger med fælles standarder til brug for at kunne måle på barnet eller de unges progression.

Projektet skal desuden understøtte den dialog, der foregår mellem de aktører, leverandører, børnene, de unge og familierne, der deltager i børn og unges udvikling via en indsats. Den data, der kan samles i dag skal kvalificeres for at skabe yderligere datamæssig validitet og værdi på tværs af kommuner og stat ved, at data kan synliggøres og samles.

Kommunerne mangler pålidelige og sammenlignelige data om, hvilke typer af hjælp, der bevilges og hvordan det går børnene og de unge, herunder hvordan de udvikler sig og trives. Sådanne data kan give børnene, de unge, familierne, kommunerne og staten et bedre indblik i, om børnene og de unge kommer i trivsel og udvikler sig med de indsatser, som kommunerne i samspil med sociale tilbud mv. giver børnene og de unge.”

I forlængelse heraf lød projektets resultatmål:

- Et fælles og struktureret sprog om udsatte og handicappede børn og unges tilstande og om de indsatser, som de modtager. Det skal danne grundlag for bedre samarbejde, mere koordination og større retssikkerhed.
- At understøtte udviklingen af en fælles datamodel for resultatdokumentation af udsatte og handicappede børn og unges udvikling og progression.
- Tilretning af it-systemerne på området for udsatte og handicappede børn og unge, så disse understøtter det fælles sprog og den fælles model for resultatdokumentation på tværs af myndighed og udfører.
- Bedre grundlag for faglig og styringsmæssig prioritering af indsatser i kommunen og deling af fælles faglig viden på tværs af kommuner.

Hvad er det samlede økonomiske forbrug?

Aktivitet/år	2021	2022	2023	2024	2025	2025 ekstra	I alt
Budget - Lønmidler	0,8	1,6	1,6	0,8	1		5,8
Budget- Øvrige omkostninger	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4		1,3
Budget - Samlet finansiering	0,9	1,9	1,9	1	1,4	0,8*	7,9
Forbrug - Regnskab	0,485	1,69	1,65	1,5	1,1*	-	6,425

* Merbevilling pr. oktober 2025 til KOMBIT's udvikling af set-up for at modtage og udstille FFB-B&U-data.

* Estimeret i oktober

Hvordan var processen og inddragelsen af kommuner?


Processen var inspireret af det forudgående udviklingsprojekt Fælles Faglige Begreber på voksensocialområdet og den tilgang, der var anlagt og afprøvet i det.

Det indebar i første omgang etablering af en dedikeret projektstyregruppe, bestående af repræsentanter fra kommuner (DUBU og ikke-DUBU, store og små, øst og vest) fra København, Gentofte, Odense, Viborg, Ikast-Brande på chef-/direktørniveau, Social- og Boligministeriet, Social- og Boligstyrelsen, KOMBIT og MedCom. Kontorchef Janet Samuel, KL har været formand for styregruppen, som har haft en mødekadence på ca. 4 årlige møder frem til 2025, hvor den blev halveret grundet faseskift fra udvikling til implementeringsunderstøttelse.

Projektet indledtes desuden med kommunedialog og -besøg med bl.a. Odense, Frederikssund og København, et intro-webinar og en landsdækkende **survey** som led i afdækningen af kommunernes praksis og udfordringer ift. it-understøttelsen af dokumentation og kommunikation med afsæt i myndighedsfunktionen på det sociale børne- og ungeområde.

Dertil blev der meldt kommunale kontaktpersoner ind til projektsekretariatet og etableret et nyhedsbrev.

Udviklingsfasen centrerede sig om et forløb af **begrebsworkshops** i 2022 for udviklingen af hhv. 'tilstande' og 'indsatser'. I begge forløb deltog kommunale praktikere, fagkoordinatorer/-konsulenter og it-fagsystems-superbrugere samt begrebs- og fagkonsulenter fra Social- og Boligstyrelsen. 18 kommuner var repræsenteret i 'tilstands-forløbet', 11 kommuner i forbindelse med indsatser.

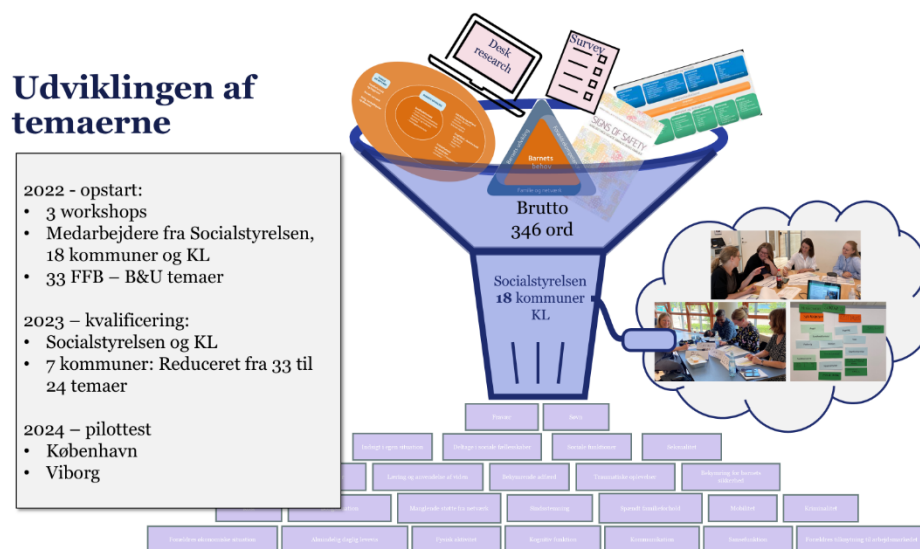

Figur 1 Illustration af proces for udvikling af FFB-B&U temaerne

Begreberne gennemgik en **kvalificeringsproces** i 2023 med involvering af 7 kommuner, og kulminerede med en decideret pilottest af 'tilstande', som i processen blev omdøbt til 'temaer', i København og Viborg over et par måneder i starten af 2024. Resultaterne fra pilottesten blev bl.a. formidlet i en afrapportering via nyhedsbrev og på kl.dk fra sommeren samt på et webinar, hvor de deltagende kommuner fremlagde både resultater og perspektiver på anvendelsesmuligheder i oktober 2024.



Opsummering af resultater

Pilottest i Viborg og Københavns kommune viste, at de fælles kommunale temaer

- ✓ er dækkende og intuitive at forstå
- ✓ flugter bedre med sagsarbejdet end de udslagsgivende forhold
- ✓ skal være let tilgængelige i IT-fagsystem
- ✓ hænger godt sammen med ICS
- ✓ kan bidrage til det faglige arbejde
- ✓ kan understøtte samarbejde på tværs

Figur 2 Oversigt over pilottest-resultater fra webinar 8. okt. '24

Efteråret indebar desuden en proces for yderligere kvalitetssikring blandt kommunale børne-/ungerådgivere, og begrebskatalogerne blev på den baggrund godkendt i styregruppen og færdig- og tilgængeliggjort via kl.dk ultimo 2024.

Anvendelsesperspektivet på FFB-B&U blev også fulgt op af bredere kommunal inddragelse i form af endnu en workshop inden årets udgang, hvor deltagere fra 9 kommuner sammen udforskede potentialer ved FFB-B&U i det børne-/unge sociale arbejde.

Med afsæt i pilottestens resultater og kommunernes refleksioner over anvendelsesmuligheder over FFB-B&U i det faglige arbejde blev der udarbejdet hhv. en skriftlig guide til anvendelse og et e-læringskoncept til kompetenceudvikling.

Fire kommuner (Aalborg, København, Sønderborg og Holstebro) gav feedback på guiden og e-læringen er udviklet med cases fra forskellige kommuner og medarbejdere i Viborg Kommune som medvirkende.

Hvad er status på projektets leverancer og succeskriterier?

Modnings- og analysefasen (juli – december 2021)

Leverancer:

Fasen rummede to typer leverancer: 1) afdækning og analyse af det kommunale landskab ift. data- og dokumentationspraksis på det sociale børne- og ungeområde og 2) et beslutningsoplæg til den videre proces.

Det mundede ud i 2 hovedleverancer fra fasen:

- En indledende afdækningsrapport fra december 2021.
- Et Beslutningsoplæg til Udbredelsesstrategi og Plan for gennemførelses- og implementeringsfasen, fremlagt for projektstyregruppen 16. dec. 2021 – og tiltrådt.

Fasens succeskriterier:

1. At der er bred opbakning i kommunerne og hos relevante interessenter til leverancerne, og at disse er operationaliserbare i forhold til gennemførelses- og implementeringsfasen.
2. At der foreligger en afdækning af it-systemerne på området.
3. At beslutningsoplægget for gennemførelses- og implementeringsfasen forholder sig til de kommunale erfaringer med resultatdokumentation samt behovene for dataunderstøttet overdragelse af viden og mere tværfaglig koordination. Dette under hensyntagen til den kommende Barnets Lov.

4. At den mest hensigtsmæssige og effektive udbredelsesstrategi for udvikling af it-understøttelsen identificeres.

Afrapportering:

- Det lykkedes at etablere en dedikeret **projektstyregruppe** med deltagelse af repræsentanter på chef/direktørniveau fra fagområdet i Gentofte, Ikast-Brande, København, Odense, Viborg kommuner (bl.a. udpeget af BKF og repræsentanter for både DUBU og øvrige IT-fagsystemer), Social- og boligstyrelsen, Social- og boligministeriet, Kombit og MedCom og med kontorchef i KL, Janet Samuel som formand. Styregruppen udarbejdede som det første et fælles værdigrundlag for projektet.
- Der blev meldt **kontaktpersoner** ind fra stort set alle kommuner til at modtage nyheder og øvrig information fra projektet.
- Afdækning af it-systemerne var indeholdt i afdækningsrapporten.
- **Beslutningsoplægget** tog afsæt i den dataindsamling blandt kommunerne, som blev gennemført i forbindelse med afdækningen af de kommunale erfaringer og behov. Lovprocessen for barnets lov blev udskudt og først 3.behandlet og vedtaget juni 2023.
- **Udbredelsesstrategien** blev tiltrådt af styregruppen som bedste bud på det givne tidspunkt.

Gennemførelse- og implementeringsfasen (januar 2022 – december 2024)

Leverancer:

- Videreudvikle på tilstande om udsatte og handicappede børn og unge og test af det fælles og klassificeret sprog for disse tilstande, der er fagligt meningsfuldt og dækkende for de udsatte og handicappede børn og unges problemer og behov, og tilsvarende et fælleskommunalt indsatskatalog. Det skal kunne anvendes uanset hvilken it-understøttelse den enkelte kommune eller det enkelte sociale tilbud anvender.
- Udvikling og test af en dataunderstøttet model for resultatmåling, der bygger på genbrug af klassificerede og strukturerede fælles begreber.
- Udvikling og test af en datamodel for sammenhængen mellem den fælleskommunale resultatmålingsmodel, og faglige værktøjer og metoder.
- Udvikling af et uddatasæt til brug for den fælleskommunale gateway og national indberetning.
- Inddragelse af it-leverandører. Valg af metode skal afgøres i Modnings- og analysefasen.
- Sikre planlægning og gennemførelse af fælleskommunale implementeringsunderstøttende aktiviteter.
- Sikre kommunernes adgang til understøttelse af den lokale implementeringsproces, herunder opgaver relateret mod den lokale projektledelse, monitorering- og sikring af fremdrift.
- Etablering af national kompetenceudvikling for medarbejdere i 98 kommuners familieafdelinger og kommunale og eksterne leverandører, så de fælles begreber forankres i den daglige dokumentationspraksis.
- Beslutningsoplæg om, hvordan projektets leverancer bedst muligt understøtter kommunernes implementering af Barnets Lov (projektets Gevinstrealiseringsfase)

Fasens succeskriterier:

1. At projektets leverancer understøtter kommunernes implementering af Barnets Lov.
2. At alle kommuner implementerer det fælles sprog for tilstande, og det tilsvarende fælles indsatskatalog.
3. At alle kommuner implementerer den fælles model for resultatmåling.
4. At alle kommunerne implementerer den fælles model for sammenhæng mellem resultatmåling og faglige værktøjer og metoder.

Afrapportering:

- **Begrebskataloger** for temaer og indsatser er udarbejdede, godkendt af projektstyregruppen og lagt på den fælleskommunale klassifikationsserver (FK-KLA) i KOMBIT. Temakataloget er pilottestet i København og Viborg af fagmedarbejdere på området, indsatskataloget er reviewet og godkendt i Social- og Boligministeriet.



Social- og Boligministeriet varslede d. 18. september 2025 alle kommuner og it-fagsystemleverandører på det sociale børne- og ungeområde om forventet krav til dataindberetning af FFB-B&U-temaerne pr. 1. jan. 2027 (frivilligt fra sommer 2026).

Dato	Ændringer
D. 1. januar 2026	Databekendtgørelsen og kravspecifikationerne, som indeholder FFB-BU på statistikkerne for underretninger, indsatser og støtte samt anbringelser, er tilgængelige
D. 1. juli 2026	- Frivillig indberetning af FFB-BU - Fortsat obligatorisk indberetning af udslagsgivende forhold
D. 1. januar 2027	- Obligatorisk indberetning af FFB-BU - Krav om indberetning af udslagsgivende forhold udgår

Figur 3 Forventet tidsplan som angivet i varslingsbrevet pr. 18. sep. '25

- Styregruppen drøftede første gang temaet om **resultatmåling** i foråret 2022. FFB-B&U-projektets bidrag til resultatmåling skal forstås som muligheden for at dataunderstøtte (via klassificering) de typisk anvendte værktøjer og målinger, som indgår i det faglige arbejde på området. Ensartet definition og afgrænsninger understøtter, at de klassificerede dele af dokumentationen i højere grad vil være genkendelige, genanvendelige og sammenlignelige.

FFB-B&U-projektet skal med andre ord ikke fastlægge, hvilke redskaber, der bedst anvendes i praksis, men kan klassificere udvalgte redskaber, og derved bidrage til ensartet it-understøttelse og dataopsamling af de udvalgte værktøjer. Det kan skabe forudsætninger for sammenligninger og overblik over aktivitet og tendenser på området.

Projektet har med styregruppens opbakning arbejdet ud fra principperne i datamodellen 'Fælles Faglige Instrumenter'. På baggrund af survey er WHO-5 (som er en klassifikation) samt SDQ, der er blevet klassificeret i projektet blevet udpeget som mulige måleværktøjer at dataunderstøtte fælleskommunalt.

De øvrige værktøjer, som blev diskuteret og undersøgt i projektet var Trivselslinealen, der dog vil kræve en del yderligere bearbejdning for at kunne klassificeres og dermed blev henlagt for nuværende samt FIT, som viste sig at være licensbelagt og utilgængelig for et videre arbejde.

Med klassificering af de valgte værktøjer har projektet skabt en forudsætning for modning og kvalificering af den aktuelle diskussion om, hvilke og hvor mange forskellige 'måleværktøjer', det giver mening at anvende fælleskommunalt i forhold til målgrupperne på området.

Sideløbende blev der i starten af 2024 igangsat et arbejde i Social- og Boligstyrelsen med at udvikle et værktøj til progressionsmåling på det sociale børne- og ungeområde til at kunne fungere på aggregeret niveau. Styrelsens oplæg til et progressionsmålingsværktøj blev præsenteret og drøftet i FFB-B&U-styregruppen ved udgangen af 2024. KL foreslog i den forbindelse en endnu tættere integration med FFB B&U-temaerne. Status på initiativet kendes ikke.

- **Uddataspecifikation** kravsættes via Databekendtgørelsen på området – det er aftalt i projektet, at dataindberetning af FFB-B&U kører via Danmarks Statistik og ikke FKG (i første omgang).
- Inddragelse af **it-leverandører** er foregået løbende primært via bilaterale dialoger og møder. DUBU er den altdominerende leverandør på myndighedsområdet, men også Systematic, KMD, SBSYS og NetCompany er til stede på markedet og har været interesserede i at følge med og leveret nyttig sparring for projektet.
- Det understøtter **implementeringen** af FFB-B&U, at temaerne kommer til at erstatte de eksisterende indberetningskrav vedr. 'udslagsgivende forhold' i Databekendtgørelsen. Der påtænkes fælles webinar mellem KL, DST, Social- og Boligministeriet, når kravsspecifikationen til de nye indberetningskrav er udarbejdet.
- Komponent har som led i projektet udarbejdet **e-læringskoncept** og tilhørende rådgivning og workshops, som kommunerne kan tilkøbe mhp. at understøtte implementering og anvendelse af FFB-B&U i faglig praksis: Fælles

Faglige Begreber - Børn og unge | Komponent.



- Alle kommuner kan frit hente Guiden til anvendelse fra kl.dk. DUBU-superbrugernetværket forventes aktivt i forbindelse med implementeringen af FFB-B&U i brugergrænsefladen. FFB-B&U Guide til anvendelse



- Lovprocessen (som trak ud) omkring **barnets lov** gjorde det vanskeligt at realisere de oprindeligt tiltænkte synergieffekter ved implementering, ligesom timingen og langstrakte faglige diskussioner ikke muliggjorde integration af FFB-B&U i barnets lov implementerings-materialer såsom opdaterede håndbøger mv.
FFB-B&U er fortsat et fordelagtigt redskab i forbindelse med de faglige ambitioner i barnets lov bl.a. ang. styrket samspil og kommunikation mellem myndighed og udfører.

Gevinstrealiseringsfasen (januar 2025 – december 2025)

Leverancer:


- Certificering af uddatasættet bl.a. til brug for aflevering til den fælleskommunale gateway og national indberetning

Fasens succeskriterier:

- Kommunerne oplever tilstrækkelig implementeringsstøtte.
- At kommunerne begynder at anvende det nye fælleskommunale standardiserede datasæt til faglig udvikling samt ledelsesinformation.
- At der er sammenhæng mellem den nye fælleskommunale datastandard for udsatte og handicappede børn og unge, og nationale indberetninger.

Afrapportering:

- Projektet har over længere tid arbejdet for at få indarbejdet FFB-B&U-temaerne i **databekendtgørelsen** på socialområdet, sådan at de erstatter de 'udslagsgivende forhold' ved underretninger og afgørelser om støttende indsatser og anbringelser. Det, ud fra et ønske om at styrke data- og analysemulighederne ved kommunernes dokumentation og dataindberetning til Danmarks Statistik samt reducere dobbeltregistrering. Til eksempel er brugen af 'anden bekymrende adfærd' i underretningsstatistikken kun blevet værre de seneste år. Der er tilfælde, hvor én af de to grunde er afkrydset på over 70 pct. af alle kommunens underretninger og andre, hvor ca. halvdelen af alle underretninger udelukkende er afkrydset i én af de to kategorier som årsag. Det vanskeliggør brugen af oplysningerne i analyse-sammenhænge.

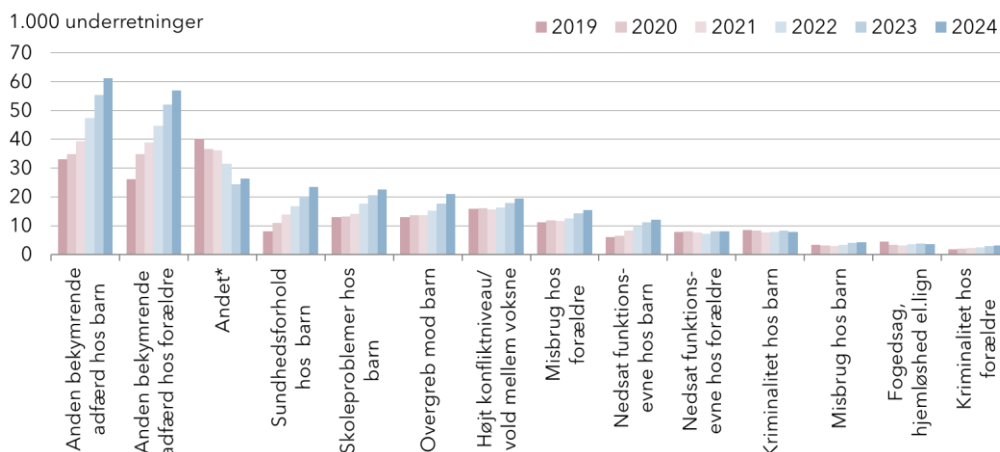


Figur 4 Andet er en sammenlægning af kategorierne Anden form for omsorgssvigt; Utilstrækkelig omsorg fra forældre; Sundhedsforhold hos en eller begge forældre; Andet og uoplyst
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Da 'de udslagsgivende forhold' ikke er veldefinerede begreber, forankret i socialfaglig praksis, blev det i styregruppen besluttet, at pilottesten også skulle belyse, hvordan det fagligt ville give mening, at FFB-B&U-temaerne erstatter de 'udslagsgivende forhold', som kommunerne skal indberette til Danmarks Statistik.

Resultatet viste en bred enighed blandt medarbejderne om, at de udslagsgivende forhold ikke repræsenterer faglig værdi i deres arbejde, men kræver tid alene af hensyn til statistik – og at de foretrak FFB-B&U-temaerne, som blev vurderet brugbare i sagsarbejdet og mere præcise ift. den faglige praksis. Projektet fik på den baggrund udarbejdet og kvalificeret en mapning ml. FFB-B&U-temaerne og 'de udslagsgivende forhold' for at minimere databrud.

Ændringen i indberetningskrav fra udslagsgivende forhold til FFB-B&U-temaer blev varslet fra Social- og Boligministeriet 18. september 2025. Det nye krav forventes at træde i kraft pr. 1. jan. 2027 med mulighed for frivillig indberetning fra sommer 2026.

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet er sendt i høring med de foreslåede ændringer pr. 14. oktober 2025.

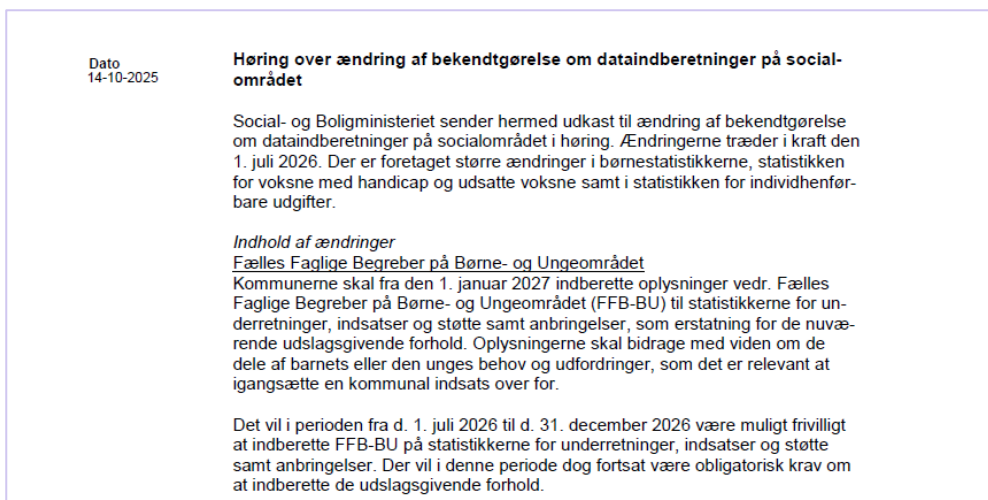


Figur 5 Udsnit af høringsbrev

- Projektteamet har gennem årene indgået i løbende dialog med en lille håndfuld forskere fra Vive med henblik på gensidig sparring og fælles afsøgning af finansieringsmuligheder for at belyse diverse forskningsspørgsmål i tilknytning til FFB-B&U.

Det resulterede i forskningsprojektet ***Improving data on at-risk children***, støttet af Trygfonden, og med opstart i første halvår 2025.

Projektet adresserer den udfordring på det sociale børn- og ungeområde, at der mangler systematiske data, som kan vise, hvilke indsatser, der virker bedst for forskellige udsatte børn – og undersøger kort fortalt om FFB-B&U bidrager med mere pålidelig, valid og faglig relevant viden om udsatte børn og unge. Forskningen baserer sig på dataindsamling blandt de frontlinjeledere og sagsbehandlere, som er tæt på de udsatte børn, og som skal bruge FFB-B&U. Forskere samler viden om, hvordan data kan understøtte indsatser til udsatte børn - vive.dk

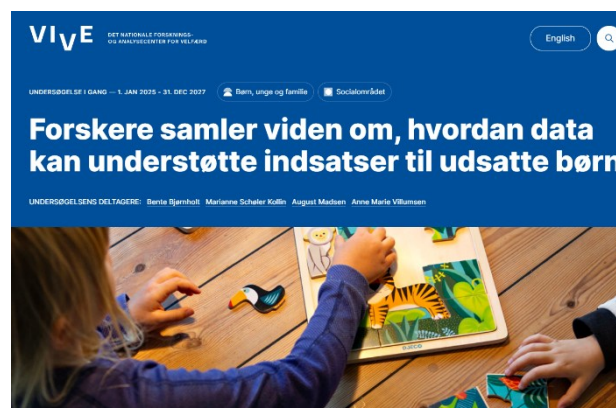

- FFB-B&U-Projektet har endvidere modtaget en merbevilling til KOMBITs arbejde med at muliggøre modtagelse og udstilling af FFB-B&U data til **tidstro ledelsesinformation** i kommunerne. Det arbejde forventes at pågå i 2026 og 2027 i tæt samspil med KOMBITs forvaltningsenhed, som overtager forvaltningen af FFB-B&U fra jan. 2026. Den fremtidige drift dækkes ind via tilslutningsaftale.

Hvad sker der efter projektets afslutning?

- Projektet overgår til drift og forvaltning af FFB-B&U i KOMBIT
- KL arbejder på at opdatere relevante blanketter og standard-skabeloner på fagområdet, sådan at den form for infrastruktur også understøtter implementeringen af FFB-B&U.
- FFB-B&U-temaerne bliver indberetningskrav forventet pr. 1. jan. 2027
- KOMBIT udvikler set-up for modtagelse og udstilling af FFB-B&U-data til brug for ledelsesinformation i kommunerne

- Komponent udbyder kompetenceudvikling; e-læring, rådgivning og workshops
- Vive forfølger forskningsdelen og ønsker at gennemføre et større forskningsprojekt med henblik på at undersøge brugen af data i bl.a. sagsbehandlingen og inkludere børnenes perspektiv.

Formidling af projektet

Projektet har perioden igennem arbejdet med formidling via følgende kanaler og aktiviteter:

- Projekt-side på kl.dk siden 2021 Fælles Faglige Begreber - Børn og Unge
- Nyhedsbrev til kontaktpersoner – dynamisk – ca. 160 modtagere
- KL's nyhedsmails til fagdirektører (Social- & sundhed og Børn & folkeskole)
- KL's Budgetvejledning til kommunerne
- Diverse oplæg, præsentationer og deltagelse på konferencer – heriblandt KL's ledernetværksmøder på det sociale børne-/ungeområde samt Digitaliseringsmessen, KLSOCIAL Børn&Unge24 + '25, Socialrådgiverdagene mv.
- Møder med (IT-)leverandører og diverse aktører på feltet (herunder Region Midt, Region Syd (autismekonference), Selveje DK, Psykologforeningen, indkøbsnetværk, EG, Sofus, KMD, Systematic, NetCompany, SBSYS, DUBU.



Fælles Faglige Begreber Børn & Unge



På vej mod ensartet
dokumentation og
bedre data på det sociale
børn- og ungeområde

Hvad?

Fælleskommunale standard-begreber for temaer og indsatser.

Hvorfor?

Fordi god dokumentation giver faglig mening, fælles viden og god kommunikation.



Fælles Faglige Begreber Børn & Unge

Oversigt over temaer

Barnets udvikling		
Mental	Social	Fysisk
Emotionel og psykisk tilstand	Sociale kompetencer og fællesskaber	Fysisk sundhed
Kognitiv funktion	Skoledeltagelse	Mobilitet og bevægelse
Kommunikation	Selvstændighed	Rusmidler
	Risikoadfærd	Sanser
	Overgreb	

Forældre-kompetencer	Familie og omgivelser	
	Omgivelser	Familieforhold
Barnets sikkerhed	Boligforhold	Misbrug omsorgsperson
Følelsesmæssig omsorg	Netværk	Kriminalitet omsorgsperson
Grænsesætning og konflikt-håndtering		Forældrenes økonomiske situation
Stabilitet og forudsigelighed		Indbyrdes relationer i familien
Stimulering og vejledning		Sundhed og trivsel hos forældre
		Sundhed og trivsel hos søskende



Fælles Faglige Begreber Børn & Unge

Oversigt over indsatser

Barnets lov	
Screening, afdækning og bemeftaglig undersøgelse	§ 18-20, 23
Rådgivning	§ 29
Tidligt forebyggende indsatser	§ 30, 31
Støttende indsatser	§ 32
Økonomisk støtte	§ 35
Pålæg	§ 38, 39
Anbringelse uden for hjemmet	§ 45-47, 53, 54, 75
Rådgivning, vejledning, undersøgelse og behandling	§ 81
Særlige dag- og klubtilbud	§ 82
Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter	§ 86
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	§ 87
Ledsagelse	§ 89
Hjælp og støtte efter lov om social service	§ 90
Ungestøtte til unge fra 18 til 22 år	§ 114, 115, 118
Dømte unge og unge i risiko for at begå kriminalitet	§ 127, 130

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	
Straksreaktioner	§ 12
Forbedringsforløb	§ 13
